



# 「北勢バイパス 坂部トンネル工事」のお知らせ

【平成29年 1月号】



平素は、北勢バイパス工事へのご理解・ご協力を賜り、有難うございます。  
 12/24 (土) 現在、トンネル掘削延長は坑口より約**73m** / **637m**です。  
 トンネル内に建設用重機が全て入るまで掘削が進みましたので、1月16日以降は夜間も掘削作業を行う予定としています。騒音で近隣の皆様にご迷惑をおかけしないように作業を行いますので、もし騒音が気になった場合は、下記の坂部トンネル工事事務所までご連絡ください。  
 また、土砂運搬は、海蔵川の橋台工事もしくは場内へ昼間のみ運搬します。  
 土砂運搬の際は一般車両優先で交通誘導を行いますので、ご協力のほどよろしくお願いします。

### <トンネル掘削および土砂等運搬予定>

1月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	
掘削作業																																
昼間作業																																
夜間作業																																
土砂運搬作業																																
昼間作業																																
ダンプ延べ台数																																

※ 土砂運搬の作業日やダンプ台数は掘削作業の進捗状況により変わる場合があります。  
 ※ 今後の掘削状況あるいは運搬先状況により大幅な変更などありましたら、都度連絡いたします。

北勢BP 工事用車両  
**五洋 No.1**  
 五洋建設株式会社




※ 当現場のダンプ (場外搬出用) および生コン車には全て上記の橙色のゼッケンがついています。

### 【連絡先】

発注者：中部地方整備局 北勢国道事務所 Tel. 059-363-5515  
 担当者：佐藤主任監督員  
 受注者：五洋建設株式会社 坂部トンネル工事事務所 Tel. 059-329-5543  
 現場代理人：田澤、監理技術者：中川

### 【トンネル掘削の進捗図】

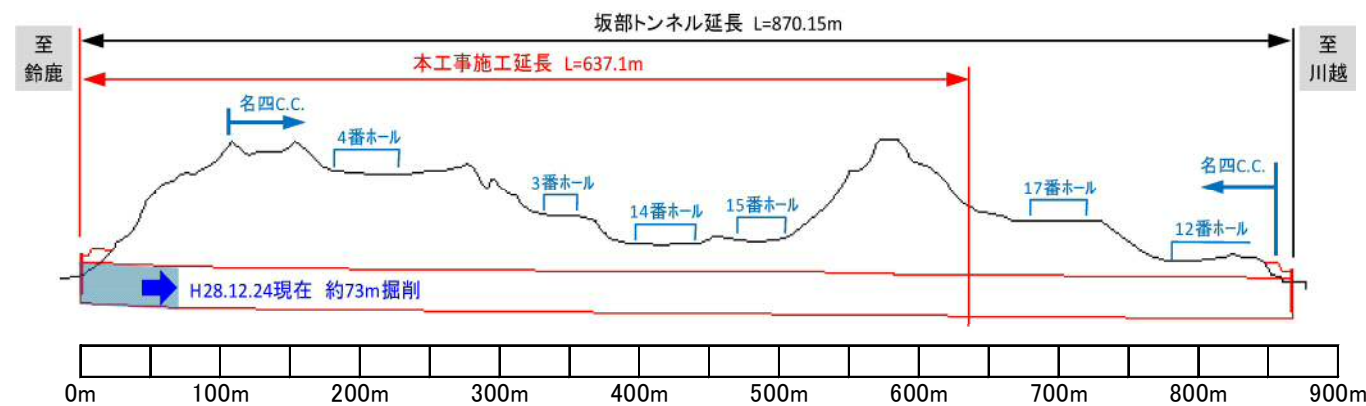

### 【土砂運搬ルート図】



### 【トンネルの掘削断面写真 (トンネル入口から約70m)】



※ 現場ホームページも開設しておりますのでぜひご覧ください。  
 現場HP <http://www.poc-site.jp/cb/sakabe/>  
 五洋HP <http://www.penta-ocean.co.jp>



【QRコード】
