



「八鹿日高道路(仮)馬瀬トンネル工事」のお知らせ

【平成28年8月号】



平素は、北近畿豊岡自動車道（八鹿日高道路）事業へのご理解・ご協力を賜り、有難うございます。
 8/10（水）現在、トンネル掘削延長は坑口より約1,404m / 1,420m、
 覆工延長は坑口より約 1,197m / 1,420mです。
 9月の土砂等の運搬につきましては、県道6号を通り岩井地区への運搬を予定しております。
 また生コン車によるコンクリート運搬を長寿の郷ルートをとるルートと予定しております。

トンネル掘削および土砂等運搬予定

9月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
発破作業																														
昼夜作業																														
県道6号ルート	ずり搬出作業																													
	昼間作業																													
	ダンプ台数	80	80	80		80	80	80	80	80		80	80	80						80	80	80								
	覆工作業																													
長寿の郷ルート	昼間作業																													
	生コン車台数	24			24	24	24	24				24								24	24	24								
	ずり搬出作業																													
	昼間作業																													
	ダンプ台数																													
覆工作業																														
昼間作業																														
生コン車台数																													24	24




当現場のダンプおよび生コン車には全て上記の黄色のゼッケンがついています。

【連絡先】

発注者：近畿地方整備局 豊岡河川国道事務所 0796-22-3126
 担当者：山中建設監督官【和田山監督官詰所】 079-670-2050
 受注者：五洋建設株式会社 馬瀬トンネル工事事務所
 工事所長：渡辺 現場事務所 079-666-8770

【運搬ルート図】

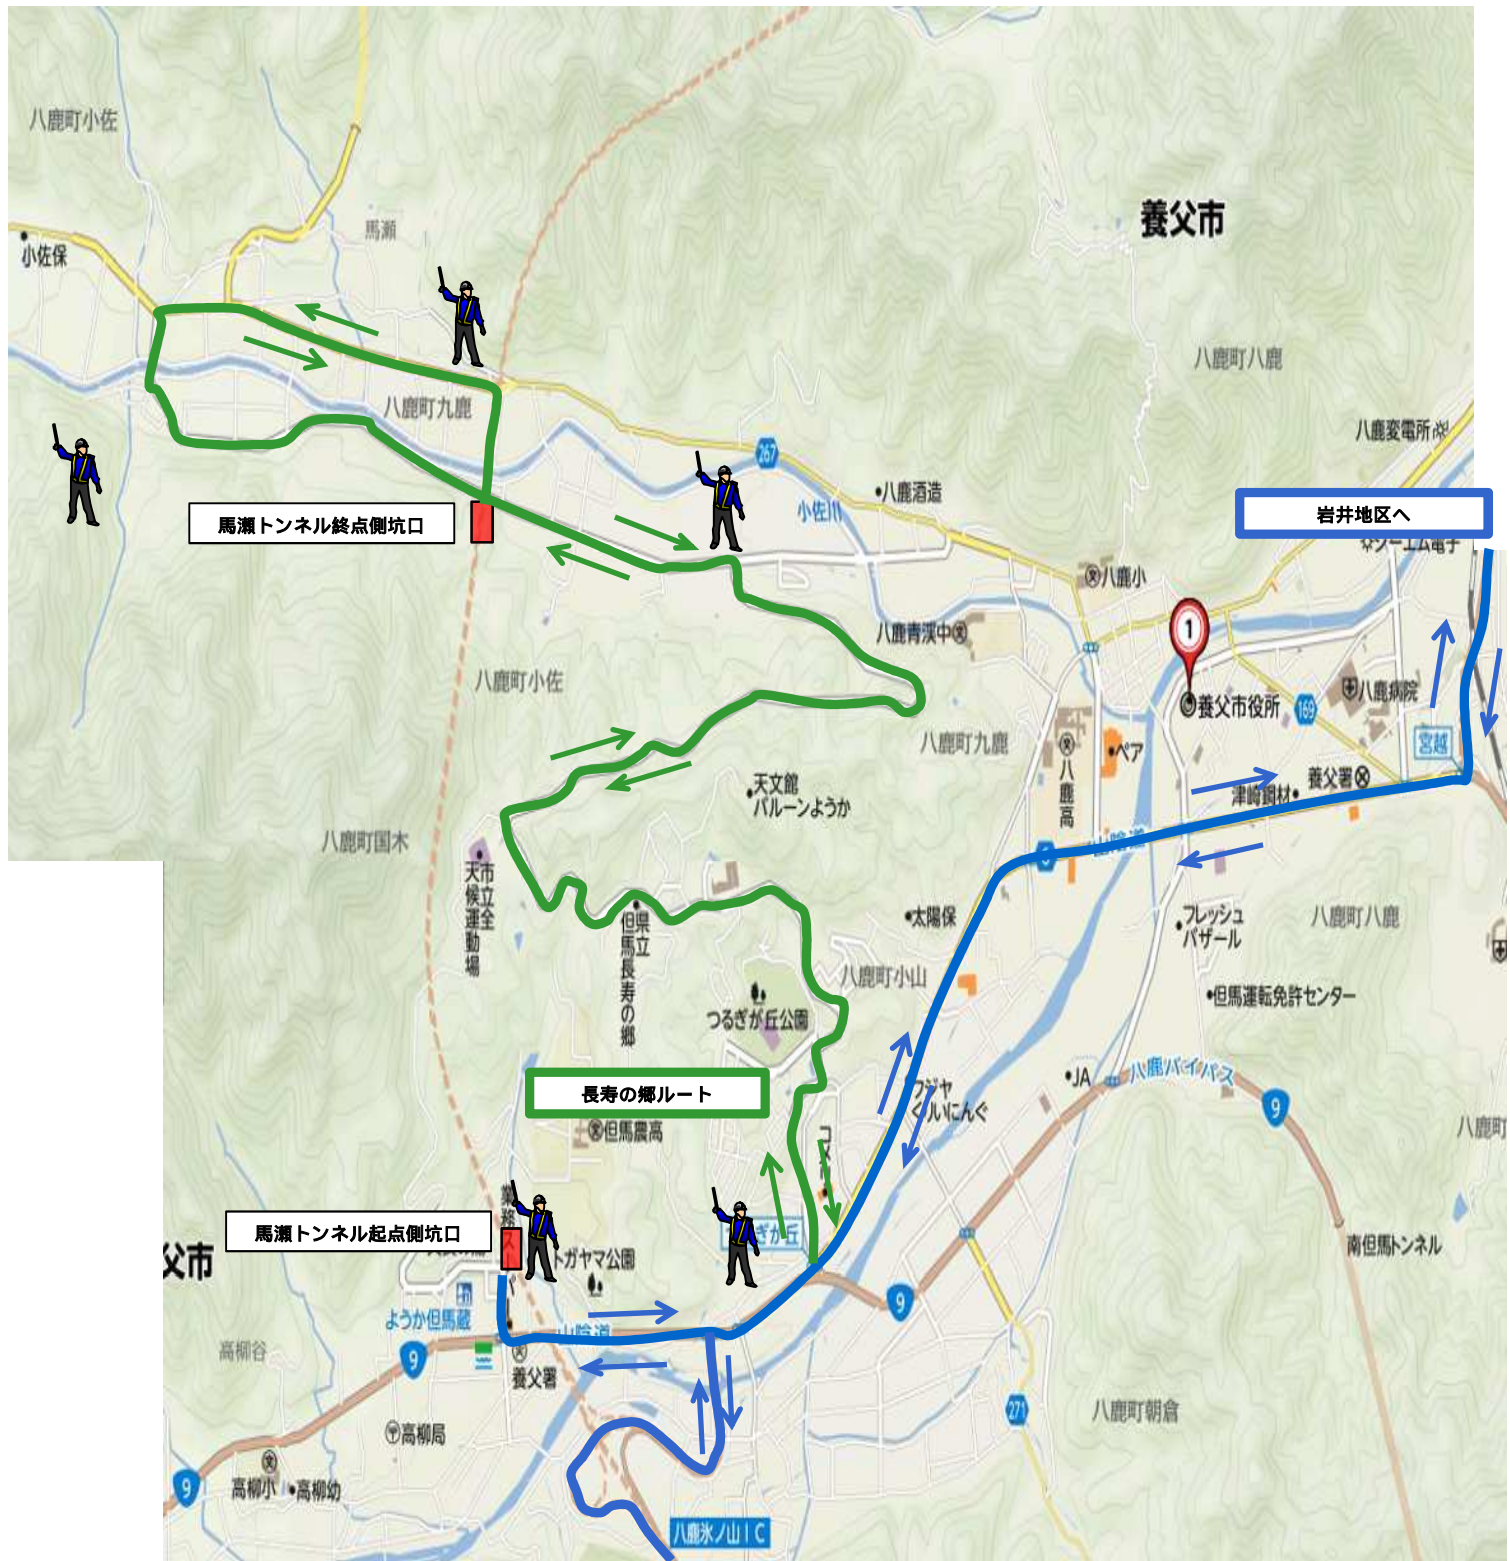

当工事もみなさまのご協力のおがげをもちまして、8月31日にトンネルの貫通を迎えることができそうです。9月に入りましても覆工作業などが残りますが、引き続きのご協力をお願い致します。

現場ホームページも開設しておりますのでぜひご覧ください。
 現場HP <http://www.poc-site.jp/cb/maze/>
 五洋HP <http://www.penta-ocean.co.jp>

